

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Demi-Lune
Bâtiment : * ---
Etage : Niveau -1

Localisation :

Local BT / PF

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
Hauteur plan : **2100 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **881 mm**
Hauteur passage libre : **2050 mm**


Support :
Cloison Maçonnerie

Ind : **0** Date : **20/04/2021**


Ind : **2**

Date : **13/09/2021**


Ind : **1** Date : **02/08/2021**

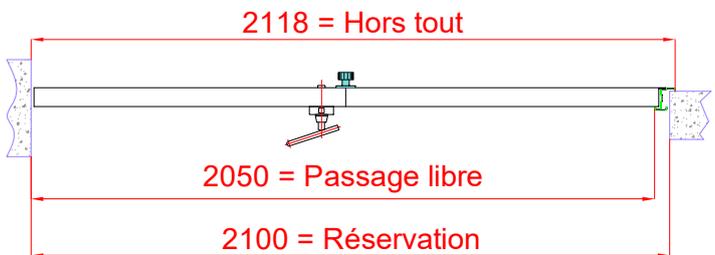

Intérieur

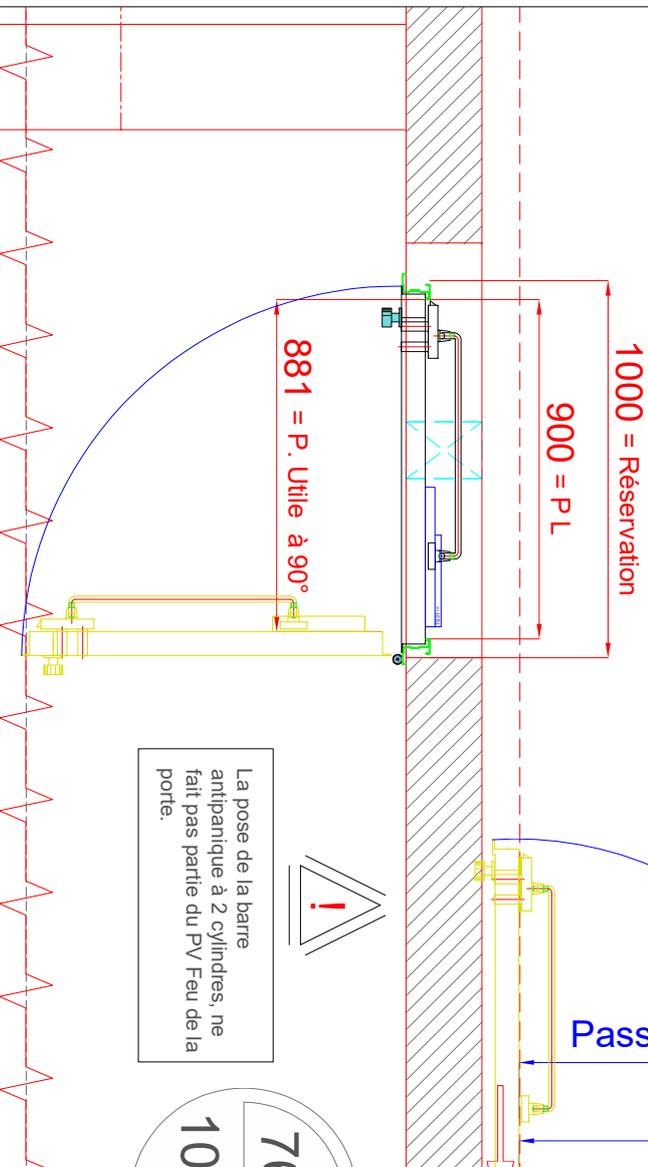

La pose de la barre antipaniqué à 2 cylindres, ne fait pas partie du PV Feu de la porte.

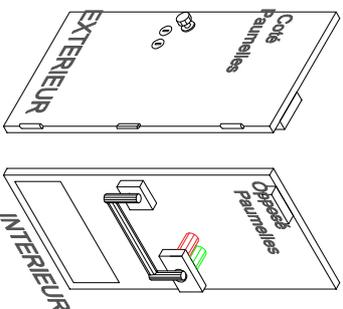

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI 60	APPLIQUE
Sens d'Ouverture PM Poussant GAUCHE	Sens d'Ouverture Client DROITE Poussant
RAL:	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Poignée rosace fixe (COTE paumelles)	P-1FXR	1
2	Barre Antipaniqué 2 Cylindres ronds	Ref : 355f10 Deny	1
3	Cylindre rond DENY	Ref : 1878-1830G	1
4	Cylindre Rond THIRARD	Ref : IDF 220	
5			
6	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
7	3 Paumelles		
8	1 Plaque de Propriété	AC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Extérieur
