FICHE DE SYNTHESE

PORTE METAL

Repère : **P5**

Client : RATP

Chantier : Affaire 1283 : Demi-Lune
Bâtiment : *---
Etage : Niveau -1

Localisation : Local BT / PF

Réservation Base Marché :	Réception des supports	Date	Réservation Validée :
Largeur plan : 1628 mm (1)	Largeur : mm	**/**/**	Largeur : - mm
Hauteur plan : 2550 mm	Hauteur : mm		Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+600=1500 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1462 mm
Hauteur passage libre : 2500 mm

Support : Cloison Maçonnerie

Ind : 0	Date : 20/04/2021	Ind: (2)	Date: 13/09/2021
Ind: (1)	Date: 02/08/2021		

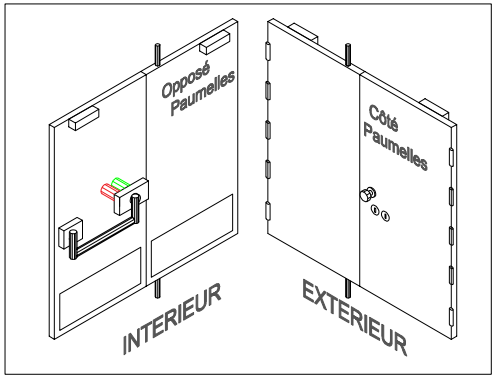

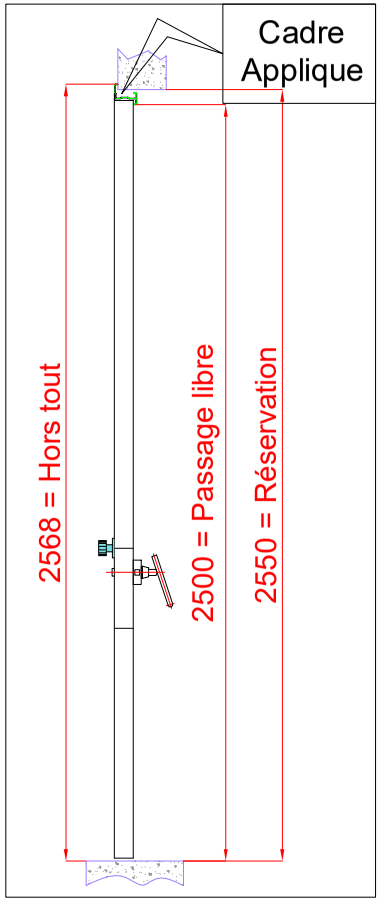

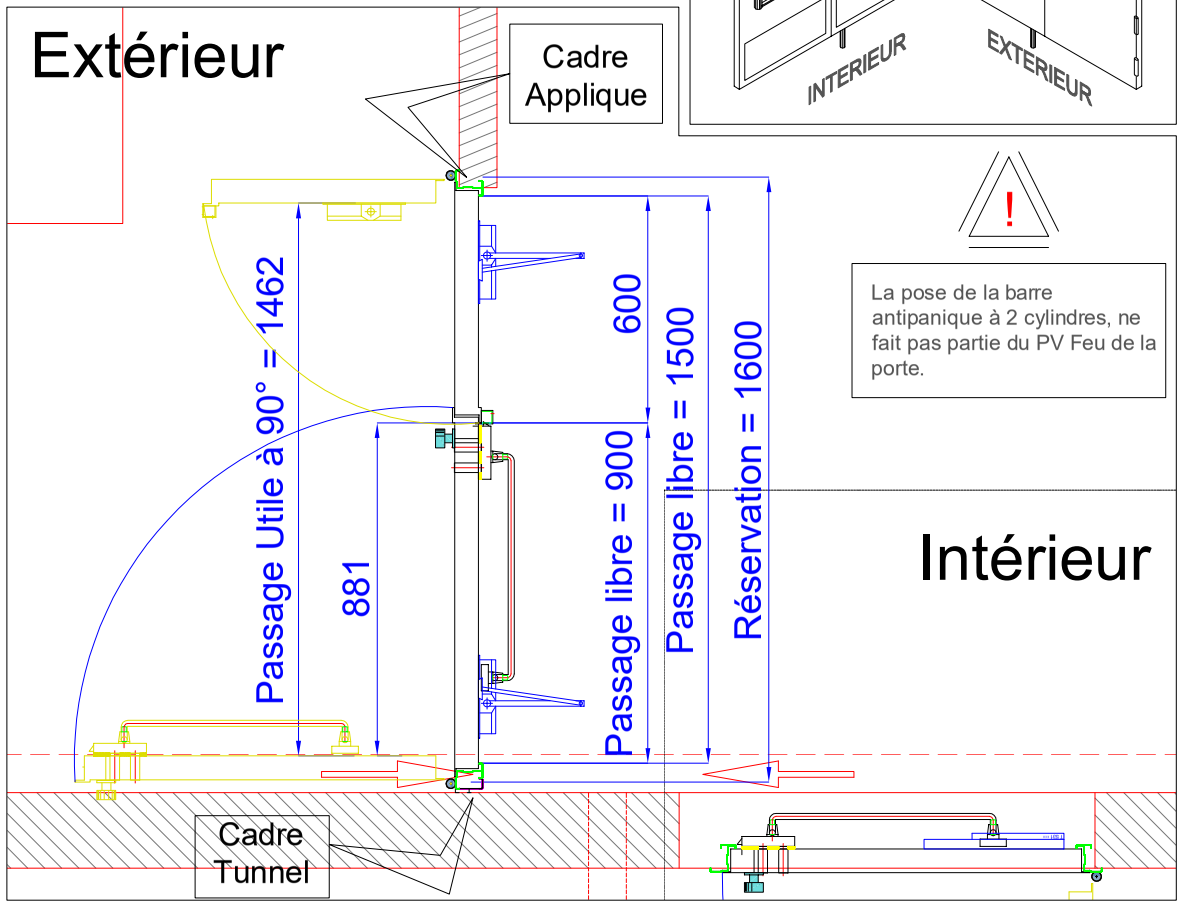

La pose de la barre antipanique à 2 cylindres, ne fait pas partie du PV Feu de la porte.

Marque de porte :	**PORTEMETAL**
Modèle :	PREMIUM Firestop
Performances chantier : Coupe-Feu EI 60	Type de cadre : APPLIQUE sur 2 cotés TUNNEL sur 1 côté
Sens d'Ouverture PM Poussant GAUCHE	Sens d'Ouverture Client DROITE Poussant
RAL:	**7035**

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Poignée rosace fixe (COTE paumelles)		
2	Barre Antipanique 2 cylindres ronds	ref : 35510 Deny	
3	Cylindre rond DENY	Ref : 3257-8	
4	Cylindre rond DENY	Ref : 1878-1830G	
5	Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles) + Selec	TS31 + SR90	
6	Crémone Encastrée (Sans béquille)	CF33	
7	5 Paumelles par vantail	SF2	
8	2 Plaques de Propreté	AC20	
9	Butée de porte	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.
